Machbarkeitsanfrage

Anfrage Nr.: 2021024

Vertrieb

Vertrieb Voranfrage

Produktgruppe Cucina **Datum:** 21.06.2021

Anfrage von: HOS Sachbearbeiter/in: SAT

Interessent: Migros

Projektname: Doppelstock PLZ / Ort: Oftringen

Ausgangsgerät / Serie: 879055 Bestell-Nr. / Typ: .....

Position: ..... Bezeichnung: .....

Abweichung (Funktion, Ausführung, Bedienung, mechanisch, elektrisch)

Beschreibung Abweichung: Doppelstock 2x 611 QT BJ 2012. Unteres Gerät soll ausgetauscht werden gegen neue Ausführung 611QT Bj. 2021. keine Kondensationshaube, beide Geräte rechts gebandet. Welche Teile an der Doppestockausführung müssen neu bestellt werden

Begründung Abweichung: .....

Anlage: Plan-Nr. ..... Zeichnung: ☐ ..... Skizze: ☐ im Anhang

Land: D Anschlussspannung: 400V ☐ **mit N** ☐ **ohne N**

Leistung .....kW Frequenz ..... Hz

Gasarten: ..... Druck ..... mbar Leistung 2 x 8 kW

Stückzahl: 1 Wunsch Liefertermin: .....

Bei gewünschtem Einbau von Fremdprodukten müssen mit der Machbarkeitsanfrage folgende Unterlagen vollständig mit eingereicht werden:

- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung
- CE-Erklärung
- Einbauzeichnung/ -vorschriften
- DWG/DXF/STEP Format

Datum: 08.06.2021 Unterschrift: M.Baumgartner

Produktmanagement

Konstruktion / Entwicklung / Technik ☐ **Einkauf** ☐

Umsetzungsaufwand:

Ja ☑ Aufwand / Konstruktion 2 Std. Produktmehrkosten: ..... €

Nein ☐ Begründung: siehe nächste Seite

.....

Lieferzeit: ..... Datum 23.06.2021 Unterschrift: R. Fischer

Produktmanagement: SAT **Freigabe:** .....

Abweichungen: .....

Listenpreis: .....€ Datum 21.06.2021 Unterschrift: .....

Zusätzliche Beschreibung Abweichung : (Funktion, Ausführung, Bedienung, mechanisch, elektrisch)

Erhalt des bestehenden Doppelstockbausatzes, unteres Gerät Abluft mit DN50. Welche Bauteile müssen neu bestellt werden?

Der neue Heißluftdämpfer muss für BS-Kombi-Mix bestellt werden, damit die Verstärkungen und Abluftrohrhalter vormontiert werden.

- Erstellung der Fertigungsunterlagen über die Konstruktion
- es werden Zusatzteile für 145 EUR benötigt (Seitenbleche,Basiswinkel, Kondensatrohr, Abluftrohr, Dichtung DN50, Abstandwinkel)
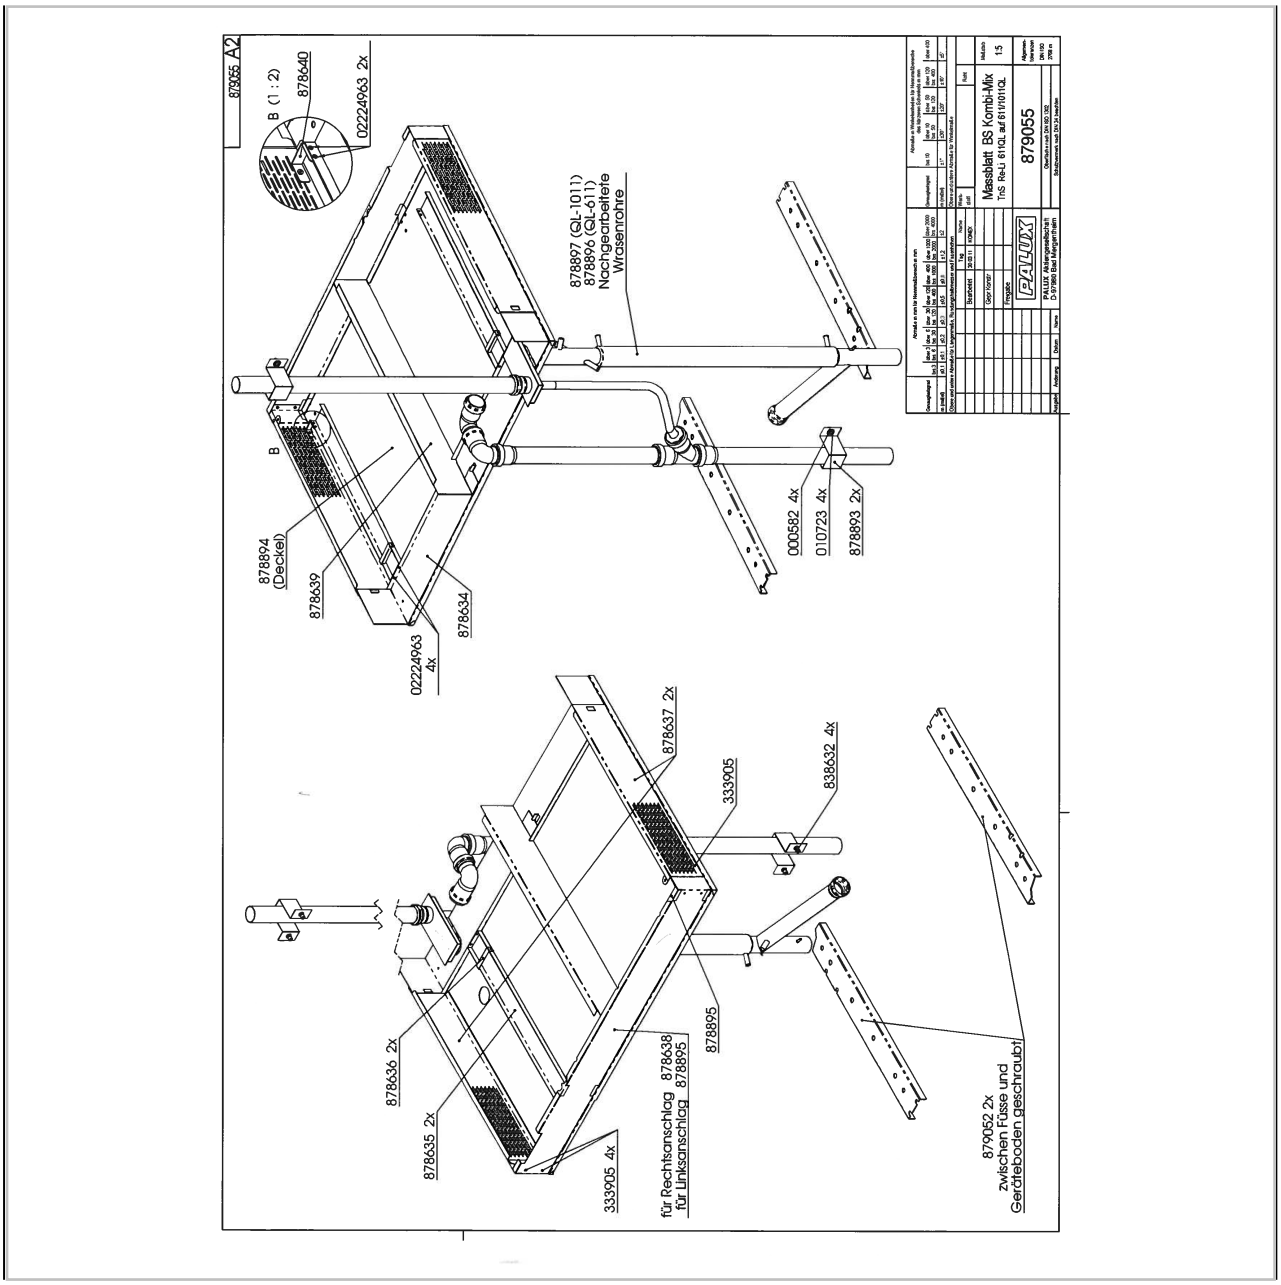
Skizze:
